Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluída	Início real	Início	Término	Término real	Predecesso	Sucessoras
1	**Reforma Apto Marquês do Pombal**	**35 dias**	**0%**	**ND**	**Seg 13/08/18**	**Ter 02/10/18**	**ND**		
2	**OBRA BRUTA**	**19 dias**	**0%**	ND	**Seg 13/08/18**	**Qui 06/09/18**	ND		
3	**Remoções e Demolições**	**5 dias**	**0%**	ND	**Seg 13/08/18**	**Sex 17/08/18**	ND		
4	Remoção rodapés de madeira	1 dia	0%	ND	Seg 13/08/18	Seg 13/08/18	ND		5II
5	Remoção piso amadeirado	2 dias	0%	ND	Seg 13/08/18	Ter 14/08/18	ND	4II	6
6	Remoção piso cerâmico Hall de Entrada	1 dia	0%	ND	Qua 15/08/18	Qua 15/08/18	ND	5	7II
7	Remoção papel de parede - Sala e Banheiro	1 dia	0%	ND	Qua 15/08/18	Qua 15/08/18	ND	6II	8II;11
8	Remoção porta Dormitório	1 dia	0%	ND	Qua 15/08/18	Qua 15/08/18	ND	7II	9;23
9	Remoção contrapiso	2 dias	0%	ND	Qui 16/08/18	Sex 17/08/18	ND	8	24
10	**Instalações elétricas**	**4 dias**	**0%**	**ND**	**Sex 17/08/18**	**Qua 22/08/18**	ND		
11	Marcação pontos elétricos	1 dia	0%	ND	Sex 17/08/18	Sex 17/08/18	ND	7	12;18II
12	Abertura de canaletas p/ pontos elétricos	2 dias	0%	ND	Seg 20/08/18	Ter 21/08/18	ND	11	13;19II;14;1
13	Inserção de tomadas máquinas de lavar e secar roupas - Área de serviço	1 dia	0%	ND	Qua 22/08/18	Qua 22/08/18	ND	12	
14	Inserção de tomadas - Sala/ Dormitórios	1 dia	0%	ND	Qua 22/08/18	Qua 22/08/18	ND	12	
15	Alteração do ponto TV - Sala	1 dia	0%	ND	Qua 22/08/18	Qua 22/08/18	ND	12	
16	Iserção de pontos p/ iluminação	1 dia	0%	ND	Qua 22/08/18	Qua 22/08/18	ND	12	20;22
17	**Instalações hidráulicas**	**5 dias**	**0%**	**ND**	**Sex 17/08/18**	**Qui 23/08/18**	ND		
18	Marcação pontos Hidráulicos	1 dia	0%	ND	Sex 17/08/18	Sex 17/08/18	ND	11II	
19	Abertura de canaletas p/ pontos das máquinas de lavar e secar roupas - Área de serviço	1 dia	0%	ND	Seg 20/08/18	Seg 20/08/18	ND	12II	20
20	Exec. Infra - Pontos de Máquinas de lavar e secar - Área de serviço	1 dia	0%	ND	Qui 23/08/18	Qui 23/08/18	ND	19;16	22
21	**Contrapiso e Arremates - Argamassa Cim/Areia**	**10 dias**	**0%**	**ND**	**Sex 24/08/18**	**Qui 06/09/18**	ND		
22	Arremate canaletas abertas para elétrica/hidráulica	2 dias	0%	ND	Sex 24/08/18	Seg 27/08/18	ND	20;16	24;23
23	Regularização e requadro porta retirada	1 dia	0%	ND	Ter 28/08/18	Ter 28/08/18	ND	8;22	
24	Execução Contrapiso - Sala / Hall de entrada e Dormitórios	4 dias	0%	ND	Ter 28/08/18	Sex 31/08/18	ND	9;22	26IT+7 dias;30II+7 dias
25	**Parede Drywall**	**2 dias**	**0%**	**ND**	**Qua 05/09/18**	**Qui 06/09/18**	**ND**		
26	Exec. Parede divisória entre dormitórios	1 dia	0%	ND	Qua 05/09/18	Qua 05/09/18	ND	24IT+7 dia	28;27

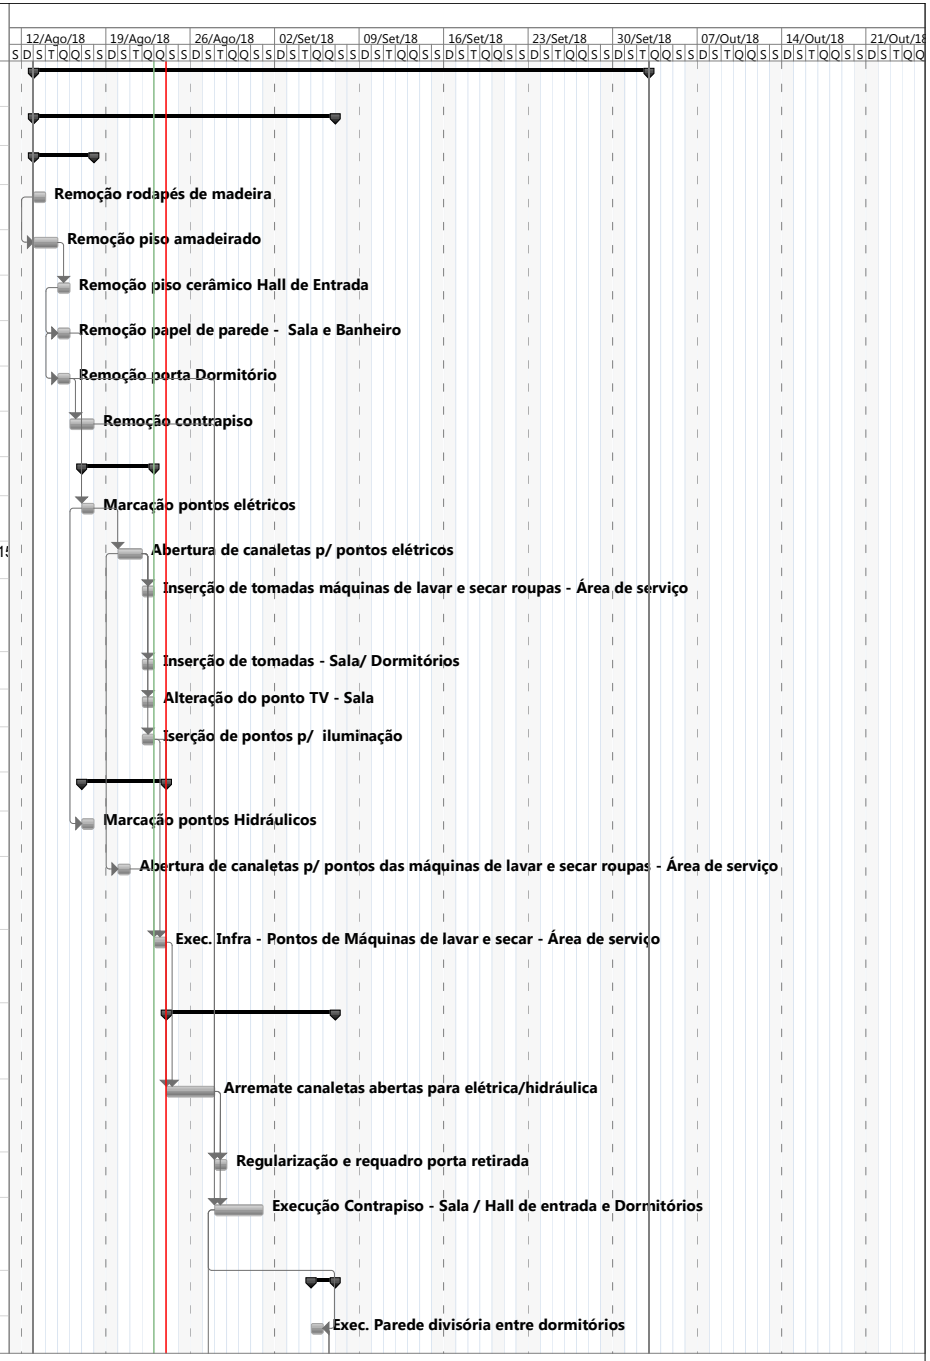
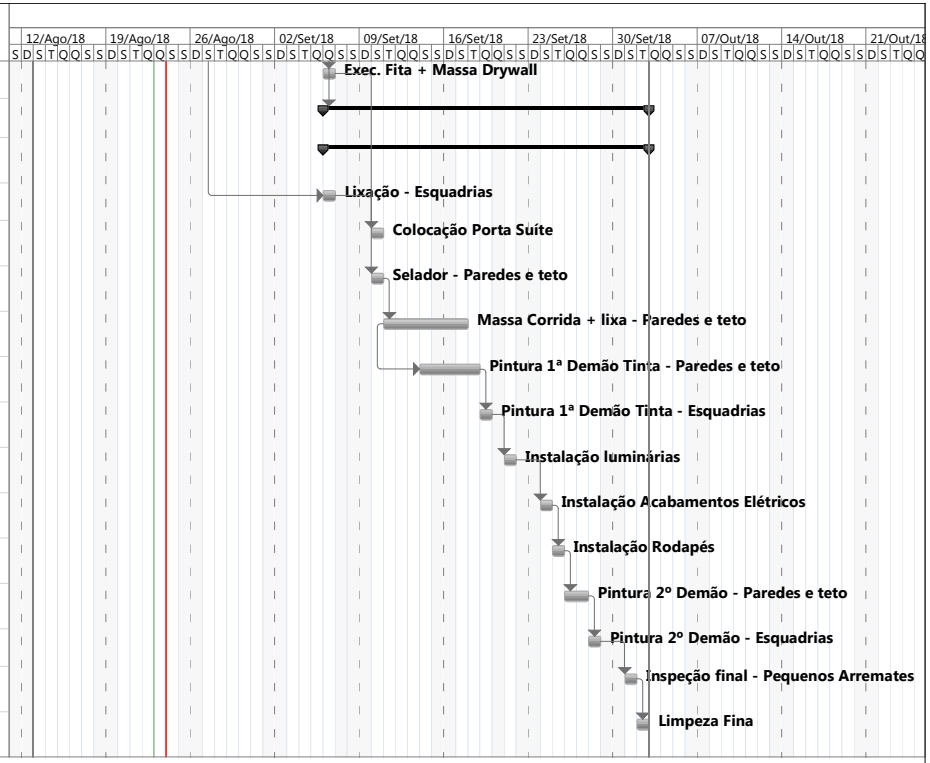
Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluída	Início real	Início	Término	Término real	Predecesso	Sucessoras
27	Exec. Fita + Massa Drywall	1 dia	0%	ND	Qui 06/09/18	Qui 06/09/18	ND	26	31
28	**OBRA FINA**	**17 dias**	**0%**	**ND**	**Qui 06/09/18**	**Ter 02/10/18**	ND	26	
29	**Área Íntima**	**17 dias**	**0%**	**ND**	**Qui 06/09/18**	**Ter 02/10/18**	**ND**		
30	Lixação - Esquadrias	1 dia	0%	ND	Qui 06/09/18	Qui 06/09/18	ND	24II+7 dias	32
31	Colocação Porta Suíte	1 dia	0%	ND	Seg 10/09/18	Seg 10/09/18	ND	27	
32	Selador - Paredes e teto	1 dia	0%	ND	Seg 10/09/18	Seg 10/09/18	ND	30	33
33	Massa Corrida + lixa - Paredes e teto	5 dias	0%	ND	Ter 11/09/18	Seg 17/09/18	ND	32	34II+3 dias
34	Pintura 1ª Demão Tinta - Paredes e teto	3 dias	0%	ND	Sex 14/09/18	Ter 18/09/18	ND	33II+3 dias	35
35	Pintura 1ª Demão Tinta - Esquadrias	1 dia	0%	ND	Qua 19/09/18	Qua 19/09/18	ND	34	36
36	Instalação luminárias	1 dia	0%	ND	Sex 21/09/18	Sex 21/09/18	ND	35	37
37	Instalação Acabamentos Elétricos	1 dia	0%	ND	Seg 24/09/18	Seg 24/09/18	ND	36	38
38	Instalação Rodapés	1 dia	0%	ND	Ter 25/09/18	Ter 25/09/18	ND	37	39
39	Pintura 2º Demão - Paredes e teto	2 dias	0%	ND	Qua 26/09/18	Qui 27/09/18	ND	38	40
40	Pintura 2º Demão - Esquadrias	1 dia	0%	ND	Sex 28/09/18	Sex 28/09/18	ND	39	41
41	Inspeção final - Pequenos Arremates	1 dia	0%	ND	Seg 01/10/18	Seg 01/10/18	ND	40	42
42	Limpeza Fina	1 dia	0%	ND	Ter 02/10/18	Ter 02/10/18	ND	41
